


RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.

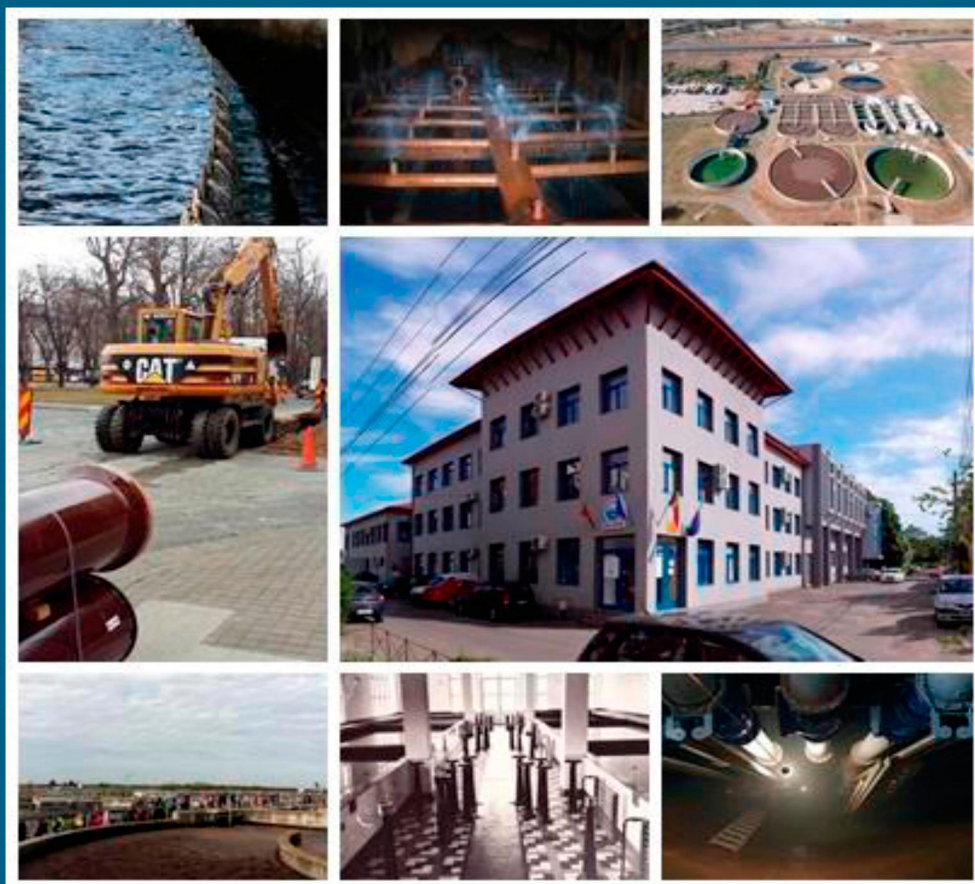

2023

Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru Trim IV 2023 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	5
5. Performanța economică.....	9
6. Programe de dezvoltare.....	10
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	10
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	16
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”	27
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	35
8. Gestionarea riscurilor la nivelul Companiei de Apă Arad S.A.....	41
9. Sistemul de control intern managerial al Companiei de Apă Arad S.A.....	42
10. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	43
11. Informații referitoare la execuția contractului de mandat al Consiliului de Administrație pentru Trim IV 2023.....	44

1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2008 prin Hot. Nr. 6 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 414/21.06.2023, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 133 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrica;
- Lucrări de construcții

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2023 și realizarea acestora

- Întocmirea strategiei de dezvoltare a Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2023,
 - Elaborarea și implementarea strategiei de tarificare în conformitate cu prevederile planului de afaceri și a strategiei privind redevența conform Ordinului ANRSC nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarificare aferentă planului de afaceri, având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 prin finalizarea procedurii de atribuire și pregătirea semnării noului contract de servicii pentru Asistență Tehnică, în vederea realizării proiectului.
 - Accesarea și realizarea din fonduri europene a următoarelor obiective de investiții:
 - „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare- Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.
 - „Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare -Axa Prioritară 11 din cadrul programului POIM-Axa prioritară 11-Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1- Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, Componentă 1 -Utilizarea energiei regenerabile la nivelul Operatorilor Regionali de apă.

- Luarea de măsuri cu caracter economic pentru contracararea efectelor negative generate de creșterea prețurilor la: materii prime și materiale consumabile, prin încheierea unor contracte noi de furnizare sau realizarea unor stocuri pentru unele materiale,
 - Furnizarea apei potabile către consumatori la parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
 - Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
 - Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare pluvială din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
 - Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
 - Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei conform Planului de investiții aprobat pentru anul 2023;
 - Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, prin monitorizarea comportării lucrărilor aferente CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor.;
 - Implementarea proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.
 - Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru realizarea planului de investiții și reparații;
 - Continuarea modernizării și dotării companiei;
 - Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
 - Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;
- Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2023 au fost îndeplinite.

4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în anul 2023:

- a) Elaborarea și avizarea prin Decizia nr. 8/13.02.2023 de către Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A: a Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare, pentru anul 2023 precum și aprobarea acesteia de către

ADIAAC prin Hotărârea nr. 7 din 14.02.2023 și AGOA prin Hotărârea nr. 2 din 27.02.2023;

b) Obținerea Avizului conform ANRSC nr. 950557/10.07.2023 pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investiții în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltată de operatorul regional Compania de Apă Arad S.A. Aprobarea prin Hotărârea nr. 17 din 17.08.2023 de către Adunarea Generală a Acționarilor a: planului de afaceri, a strategiei de tarifare și a strategiei privind redevența în urma avizului acordat de ANRSC;

c) Compania de Apă a primit de la ANRSC în urma aprobării strategiei de tarifare Decizia nr. 141/18.08.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie de operare;

d) Depunerea documentației în anul 2023 și obținerea unei finanțări de 9.896.200 lei, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare- Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali. Finalizarea cu succes a proiectului de Digitalizare a infrastructurii de apă și apă uzată ce a constat din montarea de contoare inteligente, cu scopul de a reduce pierderile și de a optimiza costurile.

e) Inițierea demersurilor de a accesa în anul 2023, a proiectului *Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA*. Proiectului în valoare de 5.953.709 lei a fost finalizat, fiind construită două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având o putere instalată unitară de 399,75 kWp, acestea fiind amplasate în incinta Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad.

f) Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 prin urmărirea implementării C.S. 2/05.04.2023 Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de Apă Arad în perioada 2022-2027,

g) Continuarea implementării proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.

h) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile;

i) Adoptarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor ca urmare a înrăutățirii situației economice datorită dezechilibrelor generate de inflație;

Volumul total de apă facturat a fost de: 12.803.301 mc, din care:

- agenți economici: 2.161.440 mc
- instituții publice: 700.605 mc

o populație

9.941.256 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,84 mc/lună;
- Lungimea rețelei de distribuție apă potabilă operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.12.2023, este de: 1.922,52 Km. În perioada ianuarie - decembrie 2023, rețelele au fost extinse cu 15,65 km în localitățile: Vladimirescu, Pecica, Ineu, Sâmbăteni, Variașu Mare și Curtici) și au fost reabilitați 4,81 km de rețea în (localitățile Arad, Gurahonț, Vladimirescu, Pecica).
- În perioada ianuarie-decembrie 2023 compania a preluat din proiectul cu finanțare europeană POIM 2061 de branșamente. De asemenea au mai intrat în patrimoniul companiei sau au fost reabilitate și un număr de 1.094 branșamente din donații și investiții, iar din fondul IID au fost reabilitate alte 727 branșamente;
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,62 kWh/mc

j) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2023 pentru clienții interni și externi este de 22.128 conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire parametru	TOTAL INDICATORI
1.	Turbiditate	1774
2.	pH (25°C)	707
3.	Conductivitate electrică (25°C)	707
4.	Amoniu	707
5.	Nitriți	547
6.	Nitrat	484
7.	Clorură	484
8.	Sulfat	484
9.	Fier	641
10.	Mangan	645
11.	Arsen	123
12.	Oxidabilitate	471
13.	Sumă de calciu și magneziu (durate)	471
14.	Clor liber	2104
15.	Colonii microorganisme (22°C)	1749
16.	Colonii microorganisme (37°C)	1749
17.	Bacterii coliforme	2293

18.	Escherichia coli	2293
19.	Enterococil intestinali	2293
20.	Clostridiumperfringens	30
21.	Prag de miros	463
22.	Culoare	463
23.	Prag de gust	463
24.	Total	22.128

k) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: 9.770.688 mc, din care:
 - o agenți economici: 1.967.043 mc
 - o instituții publice: 465.339 mc
 - o populație 7.338.306 mc

- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 2.856.596 mc, din care:
 - o agenți economici: 1.657.343 mc
 - o instituții publice: 1.199.253 mc
 - o populație 0 mc

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.12.2023, este de: 1.070,58 Km. În perioada ianuarie – decembrie 2023 au fost extinse cu 29,40 km (în localitățile Pecica, Curtici, Vladimirescu, Sântana, Hălmagiu) și au fost reabilitați 0,42 km în Arad.

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare (UAT Arad), la data de 31.12.2023, este de: 245,00 Km. Rețeaua de canalizare pluvială nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – decembrie 2023.

- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 788 de noi racorduri, din care din donații 92,

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,56 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-decembrie 2023, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2023 pentru clienții interni și externi este de 25.312 conform tabelului de mai jos:

INDICATOR	TOTAL INDICATORI
pH	2103
Materii totale în suspensie	2076
Reziduu filtrabil la 105 ⁰ C	1073
CCO Cr	2370
CBO5	2314
Amoniu	2379
Azotati	1162
Azotiti	489
Azot total	1545
Fosfor total	2313
Detergenti MBAS	829
Substanțe extractibile	720
Cloruri	308
Metale	1192
Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli	325
Cianuri fluoruri	64
Biologie	2440
pH nămol	510
MTS nămol	510
Vol la 30	510
Umiditate, substanța uscată nămol	38
Substanțe organice minerale nămol	21
Fosfor total nămol	21
TOTAL	25.312

5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2023 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	124.869.306 lei
Venituri totale	149.010.910 lei
Cheltuieli totale	141.561.133 lei
Profit brut	7.449.777 lei

Profitul brut în anul 2023, este de 7.449.777 lei, față de 3.024.247 lei, înregistrată în anul 2022. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte creșterii veniturilor totale cu 24,92%, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu doar 21,76%, față de anul 2022. Cauzele principale ale acestui rezultat favorabil sunt determinate de înregistrarea unor venituri din exploatare de 146.116.831 lei, pe fondul creșterilor semnificative înregistrate la veniturile din activitatea de bază cu 15.746.409 lei și a celor din investiții cu 3.174.540 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 140.014.702 lei, înregistrându-se astfel un profit din exploatare de 6.102.129 lei.

Profitul financiar de 1.347.648 lei, a contribuit și el la îmbunătățirea acestui rezultat pozitiv, datorită unei evoluții mai favorabile a diferențelor de curs valutar și a veniturilor realizate din dobânzi.

Având în vedere înregistrarea acestui rezultat pozitiv sunt garantate sursele necesare pentru asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori. Totodată din fondul IID sunt asigurate resursele necesare pentru achitarea ratelor de credit și a cheltuielilor de întreținere și dezvoltare.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-decembrie 2023, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID surse proprii a fost în perioada ianuarie-decembrie 2023 în valoare de 6.168.735,63 lei.

DENUMIREA LUCRARIII	LEI
Inlocuire contoare in localitati	435.336,65
Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2	1.377,44
Reab bransamente apa	483.322,37
Montare sigilii contoare de apa	11.437,75
Amenajare atelier reparatii pompe si atelier electric la Statia de Epurare	10.574,38
Realiz BY pass - SP Constitutiei vechi si realizare legatura la SPAU Constitutiei noua, in vederea preluarii cantitatii de apa uzata de la Zadareni	- .474,84
Reab retea apa supratraversare rau Mures- Pod Cetate DN 1000	22.281,61
Reab Uzina de Apa Ghioroc	3.760,11
Reabilitare racorduri de canalizare	42.897,74

Reabilitare SP10		6.643,02
Reab lab apa potabila		1.690,26
Amenajare spatiu arhiva Uzina 1		2.364,74
Reab incalzire Uzina apa Vinga		22.627,17
Reab statie pompare localitatea Felnac		22.206,29
Montare hidranti noi pe retele apa in Mun Arad		6.959,17
Monitorizare obiective CAA		494.322,60
Marirea capacitatii de captare apa cu un foraj microsistem Bocsig		1.722,15
Marirea capacitatii de captare apa cu un foraj microsistem Gurahont - Brazii		19.636,18
Reab instalatii electrice Uzina 2+front captare Nord		9.718,76
Contorizare Asociatii de Proprietari	-	16.799,11
Marire capacitate bransament electric SPAU 6, Arad		280,00
Realiz foraj de obs pt monitorizarea apei freatice din jurul stiiilor de Epurare(Savarsin, Siria, Nadlac)		9.730,02
Reab brans punct termic Banu Maracine		63.565,78
Reab conducta canal menajer Calea Romanilor		364,00
Reab retea alimentare cu apa UAT Bocsig		2.397.779,03
Extindere sistem de apa potabila UAT Livada si zona limitrofa UAT Zimandu Nou		1.182.659,76
Extindere si modernizare infrastructura de apa si apa uzata in jud Arad-POS MEDIU-POIM CH NEELIGIBILE	-	142.827,30
Reab inst incalzire si apa calda menajera la Uzina 2		49.057,55
Cresterea eficientei energiei electrice la statia de Epurare Arad		50.665,46
Marire capacitate bransament electric SPAU Hatman Arbore, Mun. Arad		50.313,61
Reab colector menajer Aleea Neptun, bl Y6-Y7, DN 200 mm, l-70m		12.712,22
Reab cladire Statie pompare Uzina 1		11.735,54
Executie foraje dirijate (Bocsig-Zimandu Nou)		78.896,90
Reab spatii adm Uzina 2 T660		4.499,68
Panou de comanda cu convertizor d efrecventa T640		15.168,25
Reab colector canalizare str Caragiale Mun Arad T662		33.754,24
Studiu fezabilitate parcuri fotovoltaice T664		156.000,00
Reab retea apa supratraversare Mures pod Cetate	-	22.281,61
Realizare by pass SP Constitutiei	-	8.064,43
Reabilitare laborator apa potabila	-	25,20
Montat sigilii contoare de apa judet		1.920,35
Inlocuire contoare neconforme judet		462.424,80
Montat sigilii contoare de apa CJA		756,62
Statie de pompare apa uzata si conducta de refulare str Constitutiei		13.539,27
Reab racorduri canalizare		4.953,82
Reab racorduri canalizare		19.667,23
Reab lab apa potabila (regie)	-	1.647,06

Reab cladire SPI apa uzata Pecica si repositionare gratar automat	-	5,20
Inlocuit bransamente deteriorate		19.006,03
Contorizare Asociatii de Proprietari		1.674.928,43
Reab statii pompare Arad: Hatman Arbore, Clopot, B Novac, Agricultorilor		130.531,70
Reab Uzina apa Pecica		59.546,83
Marirea capacitatii de inmagazinare rezervor 500 mc Halmagiu		4.176,39
Consolidare cladire Uzina Apa Cermei		14.452,13
Amenajare Statie Epurare Ineu		28.768,45
Debitmetru by-pass statie epurare Pecica		11.910,99
Reab-racordare energie electrica Calea Siriei -Uzina 2		673.633,00
Reab acoperis Uzina apa Casoia ASF213		18.553,84
Ch neeligibile proiect eficienta energetica ASF214		900,00
Autospeciala vidanja		4.298.500,00
TOTAL		12.957.105,56

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID Alte surse proprii, a fost în perioada ianuarie-decembrie 2023 în valoare de 1.470.033,54 lei.

DENUMIREA LUCRARII	LEI
Tehnica de calcul	298.567,49
Reab spatii admin CAA mansardare sediu central	12.231,07
Programe informatice, licente, certificat digital	175.946,68
Echipamente, dotari, autoturisme	922.002,84
Reab sp adm Uzina 1, STIRU si Atelier reparatii auto	41.515,74
Reab lab apa potabila (dotari)	- 18,00
Contorizare zonala Mun Arad(Gai, Uzina 2, Uzina 3)	16.813,07
Realizare incalzire hala STIRU	2.974,65
TOTAL	1.470.033,54

c) Totalul lucrărilor de întreținere din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 2023 în valoare de 1.525.332,04 lei.

Lucrari de intretinere planificate mentenanta apa Arad	70.760,29
Lucrari de intretinere planificate canal judet	91.912,06
Lucrari de intretinere planificate Apa Valea Muresului si Valea Crisului	1.131.805,00
Lucrari de intretinere planificate Statia de Epurare Arad	43.047,27
Lucrari de intretinere planificate mentenanta statii pompare canalizare Arad	94.065,13
RK utilaje autospeciale	65,13
Reabilitare capace camine vane/cutii concesi si hidranti in Mun. Arad	93.677,17
TOTAL	1.525.332,04

- d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții POIM a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 în valoare de 2.758.482.57 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM"	2.758.482.57
TOTAL	2.758.482.57

- e) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2023 în valoare de 5.520.241.40 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	5.520.241.40
TOTAL	5.520.241.40

- f) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – decembrie 2023 în valoare de 3.407.352,75 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	1.020.695,74
Refacere carosabil Arad	470.934,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	460,60
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Simand	554,06
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	1613,8
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	4842,94
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	7218,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	8399,9
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	3.503,11
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	7288,29
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	1709,34
Lucrari de intretinere planificate centrul operational apa Arad	80011,03
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	10323,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	15179,84
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	1816,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	13.726,83

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	5112,33
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	12409,03
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	6094,44
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	6.653,88
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	5949,56
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Sagu	7217,44
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani	4941,75
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	56.170,44
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare	1554,22
Lucrari de intretinere planificata centrul operational apa Valea Muresului Arad	31770,72
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	34.089,85
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi	28320,18
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel	17853,9
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	27257,04
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	36502,84
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Hasmas	11881,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	50359,5
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	9653,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	11225,5
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	11875,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	9359,34
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	28775,93
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	5521,94
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	42432,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	25842,52

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	44015,9
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	715,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	87582,81
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Grăniceri	46290,44
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu	7502,84
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sepreus	1706,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pilu	8493,41
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri	22231,8
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand	7139,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Archis	7283,49
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dieci	14750,97
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Chisindia	21662,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zerind	1211,83
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	433.682,42
Lucrari de intretinere planificată retele Canal Arad	50.140,25
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	671,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	8184,42
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	6.011,04
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ineu	5.976,61
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sofronea	8.441,40
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Savarsin	1.667,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Gurahont	1304,66
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu	1068,45
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	12267,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pancota	1842,9
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Zadareni	1201,08

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Paulis	7677,79
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Fantanele	2184,09
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Nadlac	2083,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Curtici	758,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ghioroc	1982,46
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet	983,42
Lucrari de intretinere standard canalizare pluviala Arad	451.532,25
TOTAL	3.407.352,75

II. Investiții și reabilitări finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu/POIM, PDD, INTERREG RO -HU:

1. PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010. În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133,567.269 LEI**, formată din contribuții de la:
 - 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
 - 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;
- ⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Progres fizic Faza II: 100%.

Denumire indicator	UM	Proiect faza II	Total executat până la data 31.12.2023
Extinderea rețelei de distribuție apă	km	5	9,5 km
Reabilitarea rețelei de distribuție apă	km	10	10,3 km
Reabilitarea frontului de captare	buc	1	1 buc
Extinderea rețelei de canalizare	km	28	28,4 km

Reabilitarea rețelei de canalizare	km	5	5,9 km
Reabilitarea si/sau construirea stațiilor de pompare apă uzată	buc	2	2 buc
Conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere	km	2	2 km
Construirea stațiilor de epurare apă uzată	buc	6	6 buc

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitate de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria,

care vizează

- ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
- ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
- ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
- ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
- ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
- ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
- ⇒ reabilitarea unui front de captare.

în aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 31.12.2023

Contracte recepționate

CL1 - Reabilitare rețele de apă în Municipiul și aducțiune Fântânele

Valoare finală de contract: 23.689.936,64 LEI (fără TVA), conform C.R.T.L. din 22.03.2021.

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Contractul prevede lucrări de reabilitarea a 7,5 km de artere apă potabilă pe următoarele străzi: Corbului, Calea Aurel Vlaicu, Făt-Frumos, I.C. Brătianu, Mărțișor, Meșterul Manole, Războieni, Milcov, Bvd. Revoluției, Calea Iuliu Maniu și Calea Radnei.

În data de 30.12.2022, a fost emis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 26214.

În data de 09.01.2023, Biroul Supervizare Lucrări a emis Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

CL3 Reabilitare rețea canalizare mun. Arad și tratare nămol la SE Arad

Valoare finală de contract: 11.227.577,11 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 05.04.2023.

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Contractul de lucrări a vizat reabilitarea rețelelor de canalizare pe două mari artere:

- ⇒ Bulevardul Revoluției, tronson Podgoria – Piața Avram Iancu, pe o lungime de 2.683m
- ⇒ Calea Aurel Vlaicu, tronson Piața Gării – Calea 6 Vânători și tronson Piața UTA - Făt Frumos, pe o lungime de 2.327m și căminele de vane și racordurile aferente.

La data de 31.03.2023 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 7022.

CL5 - Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector de transfer ape uzate aferent

Valoare finală de contract: 33.432.386,88 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 15.05.2020.

Antreprenor: CONAR S.A.

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una în orașul Curtici, proiectată pentru o capacitate de 15.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi și una în orașul Sântana, proiectată pentru o capacitate de 14.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.

La data de 15.05.2020 au fost emise: P.V. Recepție Finală nr. 9195 –SEAU Curtici și P.V. Recepție Finală nr. 9196 - SEAU Sântana.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 15.05.2020.

SEAU Curtici



SEAU Sântana



CL6 - Reabilitare captare apă, stație de tratare apă și rezervor de apă în Ineu

Valoare finală de contract: 8.344.873,33 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 16.02.2018.

Antreprenor: Asociera INTECO HOLDING S.R.L. și PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei;
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri;
- ⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

La data de 15.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5388.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 16.03.2018.



CL7 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Valoare finală de contract: 62.117.651,55 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 24.06.2020, revizuit.

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45 km cu executarea unui număr de 2.152 de branșamente de apă;
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 85 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal;
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompare Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Șiria și localitatea Galșa.

La data de 08.05.2010 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 8947.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 10.05.2019, fiind revizuit la data de 24.06.2020.



CL8 - Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș și colector transfer ape uzate aferent

Valoare finală de contract: 20.637.313,08 LEI (fără TVA), conform C.R.F din 12.03.2021.

Antreprenor: Asociera RADEXIM TRANS S.R.L. –ADISS S.A. – TISOTI EXIM S.R.L.


Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în orașul Pâncota, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi;
- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în localitatea Păuliș, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi

La data de 12.03.2021 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5227.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 12.03.2021.

SEAU Păuliș

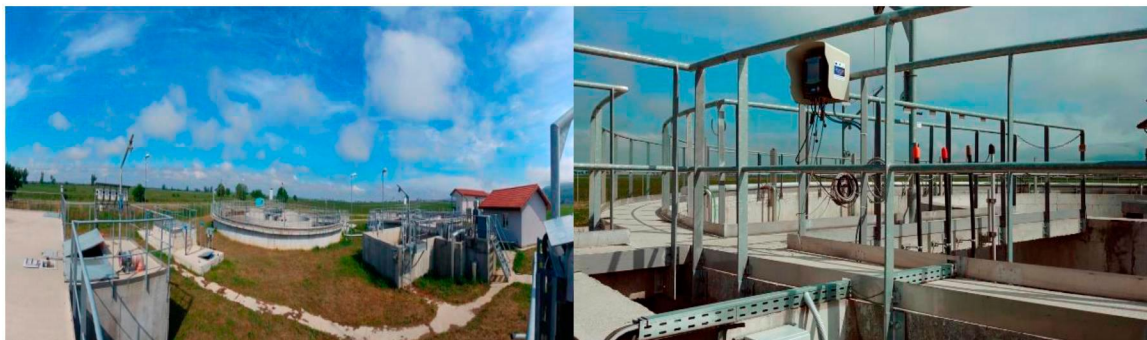

SEAU Pâncota



CL9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova

Valoare totală a investiției: 30.192.862,41 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 27.11.2017.

Antreprenor: UNIVRO S.R.L.

Sector apă:

- ⇒ reabilitarea a 9,93 km de rețele de apă în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ extinderea cu 13.71 km a rețelelor de alimentare cu apă din Cuvin, Păuliș și Lipova
- ⇒ executarea a 17,09 km de aducțiuni apă Vladimirescu-Ghioroc.

Sector canalizare:

- ⇒ reabilitarea a 2,42 km de rețele de canalizare din Lipova,
- ⇒ extinderea cu 31,60 km a rețelelor de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ 3,28 km conducte de refulare în Ghioroc, Cuvin și Miniș,
- ⇒ 5 Stații de Pompare Apă Uzată în Ghioroc, Cuvin, Miniș și Păuliș,
- ⇒ 3 Stații de Ridicare Presiune Apă Potabilă în Lipova,

La data de 22.11.2017 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 23150.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 27.11.2017.

CL 11 - Stație de epurare nouă Nădlac

Valoare finală de contract: 9.992.593,04 LEI (fără TVA), conform C.R.F din 16.12.2022.

Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L

Contractul de lucrări a vizat construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

La data de 15.12.2022 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 25359.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 16.12.2022.

SEAU Nădlac



CL13 - Stație de Epurare Pecica

Antreprenor: Asociera Hidroconstrucția SA - Probit SRL

Valoare totală a investiției: 15.183.702,02 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 30.03.2017.

- ⇒ Contractul a vizat construirea unei stații de epurare proiectată pentru o capacitate de 13.500 persoane echivalente, la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

La data de 28.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 6314.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 30.03.2017.

SEAU Pecica



CL14 - Modernizare stație de epurare Șiria

Valoare contract: 8.819.168,89 LEI (fără TVA), conform C.R.F. din 23.12.2022.

Antreprenor: ADISS S.A.

Contractul a vizat construirea unei stații de epurare mecano-biologice proiectată pentru o capacitate 7.000 de persoane echivalente, la un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

La data de 22.12.2022 a fost emis P.V. Recepție Finaă nr. 25879.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 23.12.2022.

SEAU Șiria



2. **PROIECT: *Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014+ 106397***

 <small>UNIUNEA EUROPEANĂ</small>  <small>GUVERNUL ROMÂNIEI</small>  <small>Instrumente Structurale 2014-2020</small>	<p>Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020</p> <p>Obiectiv: CS1/10.11.2016 - Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020</p> <p>Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL DE COEZIUNE prin PROGRAMUL OPERACIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 2020</p> <p>Investim în dezvoltare durabilă</p>
	<p>Beneficiar: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.</p>
	<p>Valoarea totală a proiectului: 8.665.680 LEI (TVA inclus)</p>

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

Data de semnare: 16.11.2017
Data finalizare: 31.12.2023 (Conform Actului Adițional nr. 5/27.12.2022)
Valoare contract: 7.282.084,03 LEI (fără TVA)
Părți: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management
Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar
Valoare totală eligibilă → **7.282.084,03** LEI (1.620.617,80 Euro) (fără TVA), din care:
⇒ **(99%)** finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI - **7.209.263,16** LEI (1.604.411,62 Euro), formată din contribuții de la:
▪ **(85%)** Fondul de Coeziune – 6.189.771,41 LEI (1.377.525,13 Euro),
▪ **(14%)** Bugetul de Stat – 1.019.491,75 LEI (226.886,48 Euro),
⇒ **(1%)** cofinanțare Compania de Apă Arad S.A - 72.820,87 LEI (16.206,18 Euro).

Sume alocate din fonduri publice naționale conform OUG nr. 60/2020: 4.524.000 LEI (1.006.809,99 Euro) (fără TVA).

Valoarea totală a Proiectului este de 14.049.240 LEI (3.126.639,07 Euro) (cu TVA).

Proiectul *Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020* are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Finanțarea a fost obținută în scopul contractării asistenței tehnice care sprijină Compania de Apă în vederea pregătirii aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad.

În data de 05.04.2023, Compania de Apă Arad S.A. și Asociererea Romair Consulting SRL&Complex Design SRL&Cirrus Project SRL au semnat Contractul de servicii nr. 2.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică constă în furnizarea de servicii specializate de proiectare, asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului și include 3 activități:

Activitatea I - Asistență Tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire (8.163.970 LEI)

Principalele acțiuni:

- Actualizarea Studiului de Fezabilitate care va conține inclusiv: Analiza economico – financiară (analiza cost – beneficiu), Analiza instituțională, Studiul de Impact de Mediu;
- Completarea, transmiterea și aprobarea formularului de aplicație pentru obținerea finanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria delegării, Etapa 2022 – 2027, cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Termenul de finalizare pentru Activitatea 1 Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea Documentațiilor de Atribuire este 31.12.2023.

Activitatea I este finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020 - AP 3.

Activitatea II - Asistență Tehnică pentru managementul proiectului (9.218.127 LEI)

În cadrul Activității II, Consultantul va avea obligații privind:

- sprijin pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor din proiect

- actualizarea Master Planului Regional
- actualizarea Devizului din Proiect și Studiului de fezabilitate conform prevederilor HG 907/2016
- informarea și publicitatea proiectului
- activitățile de dezvoltare a GIS

Prestarea acestor activități va acoperi o lungime cumulată de sisteme de alimentare cu apă și apă uzată de 1000 km +/- 10%, incluzând toate obiectivele aferente (captări, gospodării de apă, cămine vane, cămine vizitare, stații de pompare, stații de epurare).

Activitatea III - Asistență Tehnică pentru supervizare (31.287.738 LEI)
Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995

Consultantul va asigura serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pentru Entitatea Contractantă în conformitate cu legislația în vigoare pentru contractele de execuție lucrări din cadrul Aplicației de Finanțare aprobată.

Activități specifice de Supervizare conform HG nr. 1/2018

Consultantul va activa în calitate de Supervisor care va gestiona și superviza contractele de lucrări cuprinse în Proiect și va executa toate îndatoririle „Supervisorului”, așa cum este specificat în HG nr. 1/2018, și fazele de pre construcție, construcție și post construcție.

Activitatea II de Asistență pentru Managementul Proiectului și Activitatea III – Asistența Tehnică pentru Supervizare sunt afectate de condiția suspensivă, până la aprobarea Aplicației de Finanțare care va include bugetul contractat pentru aceste activități.

Consultantul a depus Studiul de Fezabilitate conform H.G. 907/2016 actualizat, varianta preliminară, care integrează rezultatele Analizei cost-beneficiu și Analiza instituțională actualizată. Compania de Apă Arad S.A. a aprobat varianta preliminară a Studiului de Fezabilitate, urmând ca, la începutul anului 2024, să îl transmită spre verificare către Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

3. Proiect: Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă <cod SMIS2014+> 157933

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare-Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 – Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.

Contractul de Finanțare Nr. 1978/1.03.2023

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Dezvoltare Durabilă și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de Finanțare Nr. 1978/1.03.2023.

Valoare totală eligibilă → **9.896.200 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 94% finanțare nerambursabilă – **9.302.428 LEI**, formată din contribuții de la:
 - 85% Fondul de Coeziune – **7.907.063,80 LEI**,
 - 13% Bugetul de Stat – **1.209.315,64 LEI**,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **186.048,56 LEI** ;
- ⇒ 6 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **593.772 LEI**.

Proiectul *Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă* este un proiect integrat care conține atât componente hard, cât și componente soft, obiectivul general al acestuia fiind reprezentat de creșterea gradului de digitalizare al operatorului regional C.A.A. S.A. la nivelul Microsistemului Arad.

Obiective specifice: OS1 - reducerea pierderilor sistemului și OS2 - optimizarea costurilor.

Rezultate așteptate:

În vederea creșterii gradului de digitalizare a Microsistemului Arad, se propune înlocuirea/instalarea:

- ⇒ unui număr de 11.030 contoare inteligente de apă rece, Dn20;
- ⇒ unui număr de 657 contoare inteligente de apă rece, Dn32;
- ⇒ unui număr de debitmetre electromagnetice de inserție, Dn150/200/250;
- ⇒ unui număr de 10 loggeri de presiune;
- ⇒ unui sistem de citire la distanță (echipat cu o componentă software dedicată, capabilă să integreze până la 15.000 de contoare);
- ⇒ unui sistem GPS (bază+rover+2 tablete);
- ⇒ unui număr de 2 debitmetre electromagnetice portabile;
- ⇒ unui număr de 5 terminale portabile (prin care să se facă accesul la sistemul de contorizare inteligent dezvoltat);
- ⇒ unui număr de 2 cuple optice pentru programarea contoarelor inteligente;
- ⇒ unui număr de 2 interfețe de verificare metrologică (pentru introducerea contoarelor inteligente în modul de verificare metrologică);
- ⇒ unui număr de 2 servere.

Proiectul a fost implementat cu succes, fiind finalizat la data de 31.12.2023

4. PROIECT: *Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA*

Prin implementarea proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile se urmărește creșterea gradului de energie electrică produsă din surse regenerabile la nivelul României și, așadar, contribuția la atingerea țintelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice de CO₂ echivalent agregate la nivel național. Întrucât costurile cu energia electrică au un impact semnificativ asupra rezultatului exercițiului, se impune o reducere a costurilor de exploatare. În acest sens au fost identificate locurile de consum al căror necesar de energie electrică are o pondere semnificativă la nivelul conturului energetic și implicit asupra rezultatului economic al operatorului Compania de Apă Arad și s-a propus construirea a două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având o putere instalată unitară de 399,75 kWp, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad.

Obiectiv general

Creșterea capacității de producție de energie din surse regenerabile prin construirea a două centrale fotovoltaice de către COMPANIA DE APĂ ARAD, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad, în vederea asigurării unei ponderi cât mai mari din necesarul de energie electrică ale acestora.

Obiective specifice:

Crearea a două centrale fotovoltaice cu putere instalată unitară de 399,75 kWp până la data

31.12.2023.

Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, corelat cu eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2032 – RST 2019, 2020;

Creșterea competitivității, eficienței energetice și utilizării surselor regenerabile la nivel național;

Creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de producție și reducerea dependenței de importuri.

Contractul de finanțare nr. 2216/30.05.2023

Părți: Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **5.953.709,20** lei (1.203.231,38 Euro)(**TVA inclus**).

Valoarea totală eligibilă este de lei 5.003.116,98 lei (1.011.118,81 Euro) (**fără TVA**), din care:

- ⇒ (94%) finanțare nerambursabilă – 4.702.929,96 lei (950.451,68 Euro), formată din contribuții provenite de la:
 - Fondul de Coeziune(85%) – 3.997.490,47 lei (807.883,93 Euro),
 - Bugetul de Stat (13%) – 705.439,49 lei (142.567,75 Euro),
- ⇒ (6%) finanțare Compania de Apă Arad S.A. – 300.187,02 lei (60.667,12 Euro).

Proiectul a fost implementat cu succes, fiind finalizat la data de 31.12.2023

5. PROIECT: Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Cris (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza), eMS: ROHU 208 – Acronim AQUALITY

Proiectul este implementat prin Programul Interreg V-A Romania-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 1, Prioritatea de Investiții 6/b, în cadrul parteneriatului între Compania de Apă Arad S.A. - Lider (Partener 1), Szegedi Vizmu Zrt. - Partener 2 și Administrația Locală Algyo – Partener 3 și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Valoarea totală a proiectului este de 3.093.801,24 euro inclusiv TVA.

Proiectul vizează în special „îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș, Mureș și Tisa”, în 6 puncte de măsurare interregionale, 4 în România și 2 în Ungaria, afectate pozitiv, după finalizarea proiectului.

Obiectivele:

- Proiectul oferă o abordare integrată pentru întreaga zonă transfrontalieră România-Ungaria cu obiective și activități integrate;
- Protecția comuna a râurilor Criș, Mureș și Tisa - prin investiții în infrastructura a 4 stații de epurare din România și 2 stații de epurare din Ungaria;
- Monitorizarea și raportarea - prin activități de supraveghere a calității apelor uzate evacuate din stațiile de epurare din România, dar și activități de cercetare privind efectele investițiilor realizate de partenerul din Ungaria;

6. PROIECT: Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare

In luna iunie 2023, CAA S.A. a depus la Administrația Fondului de mediu o cerere de finanțare pentru un Proiect care vizează execuția lucrărilor de branșare și racordare a consumatorilor cu venituri reduse de pe raza județului Arad, în număr estimat de 568 de gospodării. (Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și /sau de canalizare finanțabil prin PNRR componenta 1 investiția 3)

Valoarea totală a investiției este de **6.317.858,03 lei cu TVA**, și este finanțabilă integral din fonduri nerambursabile PNRR.

Termenul de implementare este 30.06.2026.

III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (Segeti VizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: ”Stația hidro Ineu” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: ”Radna/Lipova” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: ”Zădăreni” cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: ”Cil” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și Segeti Vizum Zrt.,

Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

WP1 Management – Descriere activități
Activity M1 - Project coordination

Coordonare activități pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.

Coordonarea activității privind achiziția serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia) Coordonarea derulării contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiilor de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad.

Coordonarea acțiunilor privind semnarea contractului pentru achiziția materialelor promoționale .

Coordonarea acțiunilor de Monitorizare a calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb
Avizare Rapoarte de Partener RP LP

Activitățile echipei de management realizate în perioadele de raportare RP7 și RP8 nu sunt costuri eligibile

Coordonarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021. În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova"

Cooptarea în echipa Interreg a unui nou manager financiar, urmare a decesului doamnei Diana Ancuta, respectiv a unui nou manager tehnic, urmare demisiei coordonatorului de proiect, domnul Bajo Arnold.

Urmărirea întocmirii documentației de către proiectant în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor necesare. În acest sens s-au întocmit adrese referitoare la obținerea de avize și la obținerea autorizațiilor de construire.

A fost semnat cu Arcoinstal SRL contractul nr.22 din 6.01.2022 având ca obiect verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Au fost predate de prestator Documentațiile Tehnice pentru Obținerea Autorizației de Construcție pentru stațiile de epurare Lipova și Gurahonț. Au fost trimise către verificatorii de proiecte toate documentațiile primite. Au fost verificate și de către UIP INTERREG toate documentațiile primite și au fost întocmite listele de observații și neconformități. În urma observațiilor făcute, în mai multe rânduri, de către verificatori și UIP INTERREG, prestatorul a retransmis mai multe revizii ale documentațiilor care în varianta finală au fost aprobate în CTE-ul Companiei de Apă Arad și depuse la Primăriile Lipova și Gurahonț pentru eliberarea Autorizațiilor de Construcție. În urma documentelor depuse primăriile celor două localități au eliberat Autorizațiile de Construcție.

Au fost predate de către prestator Proiectele Tehnice și Detaliile de Execuție pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Lipova și Gurahonț. Au fost trimise către verificatorii de proiecte toate documentațiile primite. Au fost verificate și de către UIP INTERREG toate documentațiile primite și au fost întocmite listele de observații și neconformități. În urma observațiilor făcute, în mai multe rânduri, de către verificatori și UIP INTERREG, prestatorul

a rentransmis prima revizie pentru SE Lipova, SE Gurahonț și SE Ineu. Revizii care sunt incomplete și care nu au rezolvat observațiile trimise.

Nenumărate adrese către prestator referitoare la întârzierile apărute în finalizarea serviciilor de proiectare și la modul incomplet, superficial de întocmire a documentațiilor, adrese prin care am solicitat întocmirea la timp, corectă și completă a Proiectelor Tehnice, cu corelarea între cerințele autorității contractante și oferta prestatorului, cu o corelare între părțile scrise, desenate și fișele tehnice.

Au fost întocmite adrese și discutate prevederile OUG64/9.05.2022 referitoare la ajustarea prețului contractului, solicitând conform Legii documentele necesare pentru a putea fi întocmită nota justificativă și Actul Adițional la contract. Analizăm documentele trimise. Au fost demarate documentele necesare în vederea încheierii unor contracte având ca obiect prestarea de servicii de dirigenție de șantier (pentru specialitățile la care Compania de Apă Arad SA nu are personal autorizat).

Coordonare activitate pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului. Act adițional nr. 2/08.06.2023 la Contractul de finanțare 39772/19.03.2019

Situațiile neprevăzute în implementarea proiectului au condus la necesitatea prelungirii perioadei de finalizare a acestuia, de la 61 de luni la 73 de luni până la 30.12.2024, având în vedere întârzierile:

- Întârzierile inițiale au fost cauzate de perioada necesară întocmirii documentației de achiziție, combinată cu situația metodei de recuperare a TVA. Astfel, implementarea proiectului a fost incertă, din cauza obligațiilor legale ale LB de a recupera TVA pentru cheltuielile finanțate din surse proprii ale CAA, de la bugetul național de stat. LB nu a lansat procedura de achiziție publică până la identificarea modului de recuperare a TVA. Primul anunț pentru procedura de achiziție publică a fost lansat în SEAP în data de 15.06.2021 (SCN1087605), la 2,5 ani de la demararea proiectului, apelul a fost anulat. A doua cerere pentru procedura de achiziție publică a fost lansată în data de 16.07.2021. Compania de Apă Arad a încheiat Contractul nr. 21/18.11.2021.

- Intarzierile in livrarea Proiectului Tehnic pentru toate statiile de epurare au dus la intarzierea inceperii lucrarilor de executie

- Întârzieri în livrarea utilajelor necesare finalizării lucrărilor la stația de epurare Gurahont, ceea ce a dus la nefinalizarea lucrărilor.

Coordonarea proiectului continuă, echipele care lucrează împreună au o comunicare clară și bună.

Verificate Rapoarte de proiecte și de partener solicitate către Secretariatul Comun (BRECO) și Expertul de monitorizare desemnat din partea BRECO.

La data de 05.09.2022, Actul adițional nr. 1/05.09.2022 la Contractul nr. 21/18.11.2021 pentru „Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montaj echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova” care are ca obiect majorarea prețului supus rezervei de implementare a proiectului.

La data de 03.08.2023, Actul adițional nr. 2/03.08.2023 la Contractul nr. 21/18.11.2021 pentru „Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montaj echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova” care are ca obiect modificarea duratei de execuție a lucrărilor.

În iunie 2023 a fost semnat Actul adițional nr. 2 de modificare a Contractului de subvenționare nr. 39772/19.03.2019 pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului la 61 de luni, în martie 2023.

În decembrie 2023 a fost semnat Actul adițional nr. 3 de modificare a Contractului de subvenționare Nr. 39772/19.03.2019 pentru modificarea perioadei de implementare a proiectului la 73 de luni și realocări bugetare între linii bugetare, în decembrie 2023.

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

- De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii JS din România, care au subliniat îndeplinirea indicatorilor ca criterii principale în monitorizarea proiectelor. Cu alte cuvinte, consideră că este important să furnizeze date privind tendințele de îmbunătățire a apelor râurilor Tisza-Körös-Maros în perioada de durabilitate. Pentru această sarcină, vom încerca să dezvoltăm o bază de date de proiect comună împreună cu experții în perioada următoare.
- De asemenea, a avut loc o întâlnire cu membrii JS din România, care au subliniat îndeplinirea indicatorilor ca criterii principale în monitorizarea proiectelor. Cu alte cuvinte, consideră că este important să furnizeze date privind tendințele de îmbunătățire a apelor râurilor Tisza-Körös-Maros în perioada de durabilitate. Pentru această sarcină, vom încerca să dezvoltăm o bază de date de proiect comună împreună cu experții în perioada următoare
- Au avut loc întâlniri între autoritatea contractantă și prestator legate de vizite pe teren, întâlniri între autoritatea contractantă și prestator care au vizat modul de derulare a contractului, în speță modul de realizare a serviciilor de proiectare, observațiile avute la întocmirea documentațiilor și a proiectelor tehnice și justificările necesare pentru aplicarea prevederilor OUG64/9.05.2022, întâlnirea din data de 25.05.2022 dintre Compania de Apă Arad SA și Szegeđi Vizmu Zrt.
- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de începere a lucrărilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptată situația de lucrări pentru activitatea de Proiectare aferenta stațiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț și Arad
- A fost emisă Factura privind serviciul de proiectare pentru stațiile de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț și Arad aferenta SIL1
- Stația de epurare Lipova:
 - o S-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor. Lucrările de construcție au fost începute (turnare beton în fundație). S-au montat echipamente.
 - o Au fost plătite facturile pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL2, SIL3 și SIL4
- Stația de Epurare Arad
 - o S-au comandat echipamentele necesare implementării proiectului, urmând să sosească o parte din acestea
 - o Au fost plătite facturile pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL2, SIL3 și SIL4
- Stația de epurare Ineu:
 - o S-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor. Lucrările de construcție au fost începute (turnare beton în fundație). S-au montat echipamente.
 - o Au fost plătite facturile pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL2, SIL3 și SIL4
- Stația de Epurare Gurahonț

- S-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor.
- A fost plătită factura pentru situațiile de lucrări prevăzute în SIL4

Activitate A.M.3: Ședința PM ținută în RP actual:

- 19 în Szeged la 11.05.2023
- 20 sedinta Arad 14.08.2023
- 21 de echipe întâlnire 05.10.2023
- 22 de echipe întâlnire 11.10.2023
- 23 sedinta Arad 07.11.2023
- 24 sedinta Arad 17.11.2023
- 25 întâlnire Algyő 20.11.2023
- 26 sedinta Arad 22.11.2023
- 27 întâlnire Szeged 29.11.2023
- 28 întâlnire Algyő 11.12.2023
- 29 întâlnire pe Zoom 13.12.2023
- 30 întâlnire pe Zoom 29.12.2023

WP2 Implementation – Descriere activități

A.T1.1 – Echipa Operațională

- Demararea achiziției serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)
- Procedura de achiziție a fost reluată la 11.12.2020, conform Anunțului de participare nr. SCN 1080006 / 11.12.2020. După evaluarea documentației, procedura a fost anulată, conform Raportului de anulare nr. 56 / 23.03.2021.
- Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021, în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova"
- Monitorizarea calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb
- Întocmire și încărcare în eMS - Rapoarte de Partener
- Întocmire și încărcare în eMS - Raport de Proiect
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru majorare buget cu valoarea TVA aferentă contribuției proprii.
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiect
- Întocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare pentru decontare cheltuieli pentru perioadele în curs

- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de începere a lucrărilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptată situația de lucru pentru activitatea de Proiectare aferentă stațiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț și Arad
- A fost emisă Factura privind serviciul de proiectare pentru stațiile de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț și Arad
- Stația de epurare Lipova:
 - o s-au întreprins acțiuni de aprovizionare cu materiale, necesare pentru demararea lucrărilor.
 - o Lucrările de construcție au fost începute (turnare beton în fundație)
- Stația de Epurare Arad
 - o S-au comandat echipamentele necesare implementării proiectului, urmând să sosească o parte din acestea

Coordonare activitate pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului. Act adițional nr. 2/08.06.2023 la Contractul de finanțare 39772/19.03.2019

Situațiile neprevăzute în implementarea proiectului au condus la necesitatea prelungirii perioadei de finalizare a acestuia, de la 61 de luni la 73 de luni până la 30.12.2024, Implementarea proiectului continuă, echipele care lucrează împreună au o comunicare clară și bună.

Monitorizarea calității apelor uzate evacuate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad din râurile Mureș și Crișul Alb

Desfășurarea activității de contabilitate financiară necesară implementării proiectului

Elaborare Rapoarte de proiecte și de partener solicitate către Secretariatul Comun (BRECO) și Expertul de monitorizare desemnat din partea BRECO.

Raportul partenerului și transmiterea raportului de proiect:

Raportul partener 3.4 transmis la FLC pe 13.10.2023 verificat pe 02.11.2023.

Raportul partenerului 12.2 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 31.01.2024

Raportul partenerului 13.1 transmis către LP la 08.05.2023 nu conține costuri sau activități.

Raportul partenerului 13.2 transmis la FLC pe 27.06.2023 verificat pe 30.07.2023

Raportul partenerului 13.3 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 31.01.2024

Raportul partenerului 14.1 transmis la FLC la 30.06.2023 verificat la 16.08.2023

Raportul partenerului 14.2 transmis la FLC pe 13.07.2023 verificat pe 17.08.2023

Raportul partenerului 14.2 transmis la FLC pe 23.08.2023 verificat pe 26.09.2023

Raportul partenerului 14.4 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 31.01.2024

Raportul partenerului 15.1 transmis la FLC pe 04.09.2023 verificat pe 05.10.2023

Raportul partenerului 15.2 transmis la FLC pe 15.11.2023 verificat pe 18.12.2023

Raportul partenerului 15.3 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 01.02.2024

Raportul partenerului 15.4 transmis la FLC pe 25.01.2024 verificat pe 12.02.2024

Raportul partenerului 15.4 transmis la FLC pe 25.01.2024 verificat pe 12.02.2024

Raportul partenerului 16.2 transmis la FLC la 12.01.2024 verificat la 08.03.2024

Raportul de proiect tehnic 11.3 depus pe JS la 10.02.2023

Raportul de proiect 12.1 depus pe JS la 27.02.2023

Raport de proiect 12.2 depus pe JS la 05.05.2023

Raportul de proiect tehnic 13.1 depus pe JS la 10.02.2023

Raport de proiect 13.2 depus pe JS la 08.08.2023

Raportul de proiect 14.1 depus pe JS la 17.08.2023

Raportul de proiect 15.1 depus pe JS la 06.10.2023

Raportul de proiect 15.2 depus pe JS la 18.12.2023
Raportul de proiect 15.3 depus pe JS la 01.02.2024
Raportul de proiect 16.1 transmis pe JS la verificarea martie 2024

AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat achizițiile pentru produse și servicii necesare implementării proiectului:

- Achiziții de echipamente de birou, echipamente IT și autovehicule.
- Echipamente de laborator și pachet de mobilier achiziționat
- Achiziție vehicul

WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity I1.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahonț ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad):

- Implementarea proiectului este întârziată în ceea ce privește achiziționarea de proiecte tehnice pentru Gurahonț și Lipova și proiecte tehnologice pentru Arad și Ineu. Astfel, lucrările de infrastructură sunt întârziate și ele.
- Începerea achiziției de servicii pentru realizarea proiectelor de investiții tehnice în Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice de instalare a echipamentelor în Arad și Ineu după cum urmează: reanalizarea specificațiilor, redactarea contractului, publicarea documentației pe SEAP. a solicitat să o verifice din nou de către ANAP, însă, din cauza modificării legislației privind achizițiile publice, SEAP a decis să publice direct documentația fără să o verifice din nou.
- Procedura de achiziție a fost reluată la 11.12.2020, conform Anunțului de participare nr. SCN 1080006 / 11.12.2020. După evaluarea documentației, procedura a fost anulată, conform Raportului de anulare nr. 56 / 23.03.2021
- Livrabilele sunt instalate în raportul partenerului 5.1.
- Finalizarea procedurii de achiziție pentru contractarea realizării documentației tehnice și realizarea lucrărilor de investiții pentru realizarea activităților la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad. În data de 18.11.2021, în cadrul unei conferințe de preză organizate a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova”
- Derularea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru ”Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova”
- Au avut loc întâlniri pentru emiterea Ordinului de începere a lucrărilor nr. 17825/07.09.2022
- A fost acceptată situația de lucrări pentru activitatea de Proiectare aferenta stațiilor de epurare Ineu, Lipova, Gurahonț și Arad , pentru care s-a emis plătit factura aferentă situației de lucrări SIL 1

Activity I1.2 Lucrări de Infrastructură Lipova

Investițiile la stația de epurare Lipova s-au finalizat, pentru care s-a încheiat Procesul verbal de recepție aferent

Activity I1.3 Lucrări de Infrastructură Ineu

Investițiile la stația de epurare Ineu s-au finalizat, pentru care s-a încheiat Procesul verbal de recepție aferent

Activity II.4 Lucrări de Infrastructură Gurahonț

Investițiile la stația de epurare Gurahonț sunt în derulare. Lucrările au început abia în mai 2023, s-a comandat o parte din utilaj, iar în decembrie starea fizică a fost de 39% și starea financiară de 38%, din acest motiv lucrările vor fi continuate și finalizate până la data de 31.12.2024 din sursele CAA. În martie 2024, starea fizică era de 59%, iar starea financiară era de 57%

Activity II.5 Lucrări de Infrastructură Arad

Investițiile la stația de epurare Arad s-au finalizat, pentru care s-a încheiat Procesul verbal de recepție aferent

WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP6 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication.

- Finalizată și terminată în RP2. Conferința de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019.

Activity A.C.2 - D.C.2.1

- Public events
- Public events organized Closeing conference Szeged + 2 Workshope Arad + Szeged
- evenimente publice: Atelierele au fost planificate pentru RP5, cu toate acestea, odată cu MR cu addendum, acestea au fost modificate în RP9, RP11 din cauza COVID-19 și prelungirea perioadei de implementare. De asemenea, Conferința de închidere va avea loc la ultimul PR al perioadei de implementare.
- În data de 18.11.2021, în cadrul în cadrul unui eveniment public - conferință de presă - organizată a avut loc semnarea Contractului nr. 21/18.11.2021 pentru "Proiectare, execuție lucrări și furnizare și montare echipamente pentru stațiile de epurare Arad, Ineu, Gurahonț, Lipova"
- Primul dintre cele 4 ateliere planificate pentru proiect a avut loc pe 11 mai 2023 la Szeged în RP14. Au urmat alte 3 workshop-uri: al 2-lea Workshop Szeged, 1 Workshop Algyő, 1 Workshop Arad și Conferința de închidere la Szeged în RP15 pe 29 noiembrie. Cu peste 70 de participanți, inclusiv reprezentanți ai mai multor posturi de presă și radio, împreună cu invitații noștri. invitați, a fost posibilă trecerea în revistă a dezvoltărilor realizate și a evenimentelor de proiect pentru toți cei trei parteneri cu ajutorul prezentărilor și filmelor. Aceasta încheie ultima activitate de comunicare. Această activitate este finalizată și finalizată în RP15..

Activity A.C.3 Promotional material

- Obligatory promotion materials pack
- Derulare contractului pentru realizarea materialelor publicitare
Au fost executate și montate - conform contractului nr. 17 din 13.07.2020, caietului de sarcini nr.421 din 8.11.2019, comenzii nr. 18 din 9.12.2019, procesului verbal nr.6397/31.03.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal nr. 7547/15.04.2022 cu notă de execuție și montaj, procesului verbal nr. 8341/29.04.2022

cu notă de execuție și montaj, procesului verbal de recepție nr.401 din 5.07.2022 și a avizului favorabil primit de la SC al BRECO Oradea - panourile temporare la cele patru stații de epurare.

- Activitatea A.C.3 Finalizată și finalizată în RP2

7. Comunicarea și relațiile cu clienții


Compania de Apă Arad a urmărit și în anul 2023 promovarea unei imagini transparente și pozitive a societății, cu intenția de a asigura liberul acces al cetățenilor la informațiile și activitățile de interes public ale Operatorului.

Scopul urmărit prin activitățile de comunicare desfășurate de-a lungul anului a fost creșterea nivelului de încredere al clienților în calitatea serviciilor și a produselor oferite dar și optimizarea procesului de comunicare dintre Operatorul regional și clienți, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei clienților și identificarea unor acțiuni care să vină în sprijinul lor.

Cu ducerea la îndeplinire a acestui obiectiv de informare și educare a populației privind importanța socială a activității Companiei de Apă Arad, se ocupă cu prioritate Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media. Mediatizarea activității CAA se realizează în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În materialele transmise presei au fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

Remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție apă potabilă. Utilizatorii au fost informați despre întreruperea în furnizarea serviciului de alimentare cu apă prin intermediul paginii web CAA, a paginii oficiale de Facebook a Companiei de Apă Arad și sunt transmise prin email și către DSP Arad.

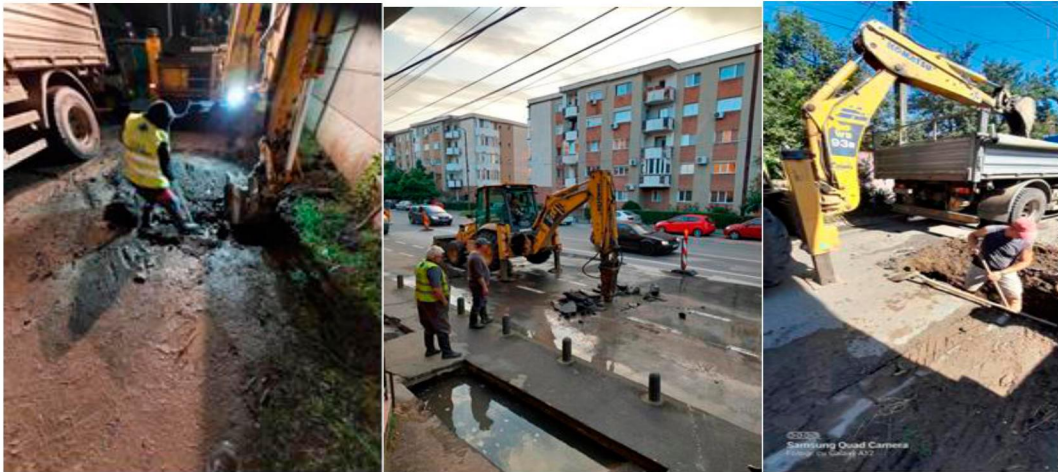

Măsuri de protecție a instalațiilor împotriva înghețului



Compania de Apă Arad a făcut recomandări în situația căminelor de bransament aflate pe domeniul privat. Conform legislației în vigoare, utilizatorilor le revine responsabilitatea protejării de îngheț a contoarelor montate pe proprietatea lor și tot ei vor suporta cheltuielile aferente, în situația în care contorul s-a defectat pentru că nu a fost protejat suficient.

Ziua Mondială a Apei 2023 - Sloganul propus de UN – Water pentru anul acesta este: „Să accelerăm schimbarea!”, nuanțat de un mesaj mai detaliat: „Fă schimbarea pe care tu ți-ai dori să o vezi în lume! Fiecare picătură/gest contează!”. Gheorghe- Vasile Borha, Director General, Compania de Apă Arad: „Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei subliniem încă o dată că misiunea Companiei de Apă Arad a fost și este să asigure servicii de alimentare cu apă și de canalizare de calitate, fără să aducă prejudicii resurselor naturale și mediului înconjurător. Prin toate investițiile care s-au făcut și se vor face în anii următori se urmărește îmbunătățirea continuă a performanței de mediu prin: gestionarea rațională și utilizarea durabilă a resurselor naturale, conservarea resursei naturale – apa și de asemenea îmbunătățirea calității apelor evacuate. Suntem aici pentru ca arădenii să se bucure de apă curată și bună de băut și tot noi ne asigurăm că apa se întoarce curată în natură și sigură pentru mediul înconjurător.”

Vizite la Uzina de Apă nr.2 și Stația de Epurare – manifestări cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2023. Sute de elevi de la școli și licee arădene au vizitat cele două obiective ale Companiei de Apă Arad, ocazie cu care au aflat tresele tehnologice ale apei potabile și respective ale apelor uzate.





Programele Școala Altfel și Săptămâna Verde au însemnat zile pline în care aproape 2000 de elevi de la clasa I și până la liceu au vizitat atât Uzina de Apă cât și Stația de Epurare.






Apeluri repetate către utilizatori de a nu mai arunca șervețelele umede în toaletă, deoarece, acestea reprezintă cel mai mare pericol pentru sistemul de canalizare! Compania de Apă Arad atrage din nou atenția: toate tipurile de șervețele umede, atât cele pentru igiena mâinilor cât și cele pentru igiena intimă sau cele destinate bebelușilor, trebuie aruncate în coșul de gunoi!



Semnarea contractului de servicii pentru proiectul: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și elaborarea documentațiilor de atribuire, asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Companiei de apă Arad în perioada 2022-2027. Durata totală a contractului este de 98 luni și acoperă în întregime cele trei etape ale contractului: Asistență tehnică pentru actualizarea Aplicației de Finanțare și elaborarea Documentațiilor de Atribuire, Asistența Tehnică a pentru Managementul Proiectului și Asistența Tehnică pentru Supervizare, ce include atât perioada de execuție a contractelor de lucrări cât și perioada de garanție a lucrărilor (perioada de notificare a defectelor).



Intervenții ale angajaților Companiei de Apă Arad în cazul ploilor torențiale când, din cauza cantităților excepționale de precipitații, canalizarea a făcut cu greu față.

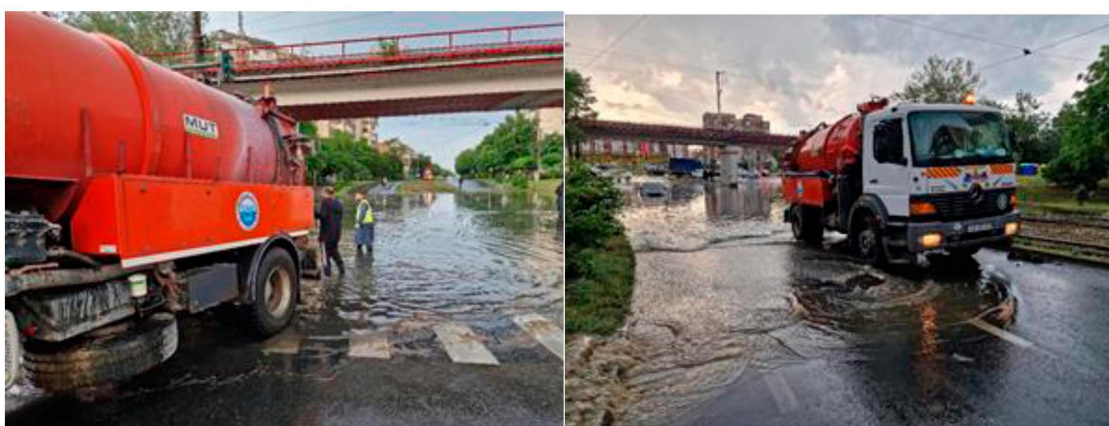

Campania de înlocuire a vechilor contoare cu altele noi, cu citire la distanță. Peste 11 mii de contoare inteligente au fost montate până la sfârșitul anului 2023 în municipiul Arad, în cadrul implementării proiectului cu finanțare europeană „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Arad – contorizare inteligentă”, accesat de Compania de Apă Arad.

Montarea contoarelor inteligente a fost gratuită și s-a făcut etapizat, pe cartiere și pe străzi, după un program stabilit cu antreprenorul care a câștigat contractul de lucrări. Clienții din zonele afectate au primit notificări la domiciliu iar anunțurile au fost publicate pe website-ul Companiei de Apă Arad - www.caarad.ro, pe pagina de Facebook a companiei dar și în presa locală.



Atenție la escroci! În timpul campaniei de înlocuire a contoarelor vechi, unii utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare au primit în cutiile poștale anunțuri în care apare indicat și numele Companiei de Apă Arad, cu oferte pentru achiziționarea de contoare cu citire la distanță. În anunțul respectiv era trecut și prețul pentru un contor, care varia între 300-500 lei dar și 100 de lei, montajul pentru un contor. Compania de Apă Arad a avertizat utilizatorii să nu ia în seamă astfel de anunțuri! Înlocuirea vechilor contoare mecanice cu cele noi, cu citire la distanță, este gratuită!

Începutul anului școlar 2023-2024 a însemnat și reluarea programelor Săptămâna Verde și Săptămâna Altfel. Compania de Apă Arad a deschis porțile celor doua obiective, Stația de Epurare și Uzina de Apă pentru a veni în sprijinul școlilor din municipiu. Elevii au ocazia astfel să vadă și să înțeleagă care sunt procesele tehnologice prin care trece apa până ajunge la robinete și apoi, după ce este folosită în gospodării și în industrie, cum este curățată pentru a putea fi deversată în râul Mureș.



A fost finalizată montarea panourilor fotovoltaice în incinta Uzinei de Apă nr. 2 și la Stația de Epurare Arad. Cele 615 module PV cu o putere minimă de 650 WP au fost instalate pe o suprafață de peste 67 mii mp în incinta Uzinei de Apă Arad urmând să asigure o pondere

de autoconsum (direct și indirect, prin compensarea cantității de energie electrică injectată în SEN) de: 537,16 MWh/an (12,29%) în primul an de funcționare.



Cele două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile (de la Uzina de Apă Arad și din incinta Stației de Epurare) au o putere instalată unitară de 399,75 kWp. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare, valoarea acestuia fiind de 5.953.709,20 lei (TVA inclus).

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut și în anul 2023, prin mijloace de informare în masă: locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal Arădean, Live Arad, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Actualități- Arad, TV Arad, LaStradaTv, Aradobiectiv.ro, Radio Timisoara.

Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media a continuat pe tot parcursul anului 2023 administrarea paginii de internet a Companiei: conținutul paginii de internet a fost actualizat cu anunțuri, comunicate de presă și alte materiale informative. Pe pagina de Facebook a Companiei s-au regăsit anunțuri privind înlocuirea și citirea contoarelor de apă dar și ultimele informații privind stadiul lucrărilor la infrastructura de apă și de canalizare aflate în derulare.

8. Gestionarea riscurilor la nivelul Companiei de Apă Arad S.A.

Conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în cadrul Societății Compania de Apă Arad SA s-a implementat și se menține implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

A fost constituită Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM al CAA prin Dispoziția nr. 227/23.12.2010, reactualizată cu Dispoziția 281/07.06.2023, condusă de un președinte și compusă din conducătorii locurilor de muncă din prima linie de conducere din cadrul CAA. Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Control Calitate.

Standardul 8 - Managementul riscului – managementul riscului este condus cu atenție deosebită, deoarece este în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor societății. Astfel, conducătorul entității publice instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor societății.

Gestionarea riscului în cadrul CAA se face conform procedurii de sistem PS-CI - 05 Managementul riscului.

Au fost identificate și înregistrate în Registrele de risc toate riscurile aferente activităților desfășurate în cadrul CAA, de către responsabilii de risc a entităților funcționale. Registrele de risc se transmit secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare și se centralizează în Registrul de risc al CAA care se actualizează semestrial.

Fiecare entitate funcțională și-a stabilit și implementat măsuri de control în vederea împiedicării producerii riscurilor, măsuri centralizate în formularul FS-CI-05-04 Planul pentru implementarea măsurilor de control.

Prin aplicarea măsurilor de control la nivelul fiecărui loc de muncă, a fost redusă expunerea la risc astfel încât a fost posibilă clasarea unui număr de riscuri.

În cadrul CAA, la trimestrul IV 2023, situația este următoarea: 476 riscuri identificate asociate activităților din care: 469 acceptate, 4 riscuri escaladate și 3 clasate.

Până la această dată nici unul din riscurile identificate și acceptate nu s-a produs, măsurile de control luate pentru fiecare loc de muncă dovedindu-se eficiente.

9. Sistemul de control intern managerial al Companiei de Apă Arad S.A.

Conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în cadrul Societății Compania de Apă Arad SA s-a implementat și se menține implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

Astfel, la nivelul Companiei de Apă Arad SA există:

- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM al CAA prin Dispoziția nr. 227/23.12.2010, reactualizată cu Dispoziția 281/07.06.2023. Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Control Calitate;
- Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial în cadrul CAA pentru anul 2023 nr. 67/04.01.2023;

Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat. În cadrul CAA, la trimestrul IV 2023, situația se prezintă după cum urmează: 476 riscuri identificate asociate activităților din care: 469 acceptate, 4 escaladate și 3 clasate. Până la această dată nici unul din riscurile identificate și acceptate nu s-a produs, măsurile de control luate pentru fiecare loc de muncă dovedindu-se eficiente.

În urma centralizărilor făcute de Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare din cadrul CAA cu privire la riscurile de corupție, s-a constatat că în cadrul CAA nu au fost identificate riscuri de corupție.

Procedurile operaționale aferente activităților procedurale inventariate sunt elaborate în proporție de 95,7%. Din totalul de 310 proceduri operaționale, 297 au fost aprobate și 13 sunt în elaborare.

Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice. Total obiective specifice – 138, total activități – 362, total indicatori de performanță – 159.

La trimestrul IV 2023, sistemul de control intern managerial al Companiei de Apă Arad SA este implementat și menținut în conformitate cu standardele cuprinse în OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

10. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Implementarea de către Compania de Apă Arad S.A. a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri avizată de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944/10.07.2023 și aprobată de către AGA prin Hotărârea nr. 17/17.08.2023;

- Realizarea obiectivelor din planul de investiții și întreținere asociat planului de afaceri pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, conformarea cu Directiva Apei Potabile nr. 98/1993 și conformarea cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane nr. 271/1991,

- Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată:

- o Obținerea unei finanțări prin programul INTERREG ROHU VIA 2021-2027 pentru care s-a depus în luna decembrie 2023 cererea de finanțare nr. ROHU 0184 Water Risk Prevention și care are ca obiectiv implementarea unor soluții de adaptare a activității societății la schimbările climatice și de a supraveghe a infrastructura de apă și apă uzată pentru prevenirea riscurilor de inundații;

- o Obținerea finanțării pentru proiectul “Dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă în Algyo și Arad” prin depunerea în luna ianuarie 2024 a cererii de finanțare ROHU 0460 Reducerea emisiilor GES, având ca obiectiv creșterea cantității de energie electrică obținută din surse regenerabile și reducerea emisiilor GES prin diminuarea cantităților de combustibili convenționali utilizați;

Contract de parteneriat pentru constituirea Consorțiului Regional pentru învățământ Dual Vest Timișoara ce a fost semnat în data 20.01.2023, liderul de proiect este Universitatea Politehnica Timișoara iar partenerii sunt în număr de 34 (din care : Aquatim SA, Apa Prod Deva , Primaria Timișoara, Unități de învățământ, Agenți economici, etc.);

- Reducerea pierderilor de apă și a consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu apă și de canalizare în vederea menținerii unor cheltuieli cu energia cât mai reduse,

- Aplicarea unor măsuri de eficiență economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, în condițiile instabilității economice și a unei rate a inflației ridicate, măsuri care trebuie să asigure stabilitatea economică a companiei, precum și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;

- Dezvoltarea de către Operator a structurilor și sistemului procedural propriu în domeniul tehnicii de calcul și securității informatice, în vederea eficientizării sistemului informatic și utilizării acestuia la potențialul său maxim cu riscuri minime prin dezvoltarea sistemului integrat prin implementarea modulelor (clienți, financiar, contabilitate, managementul activelor), registratura electronica si arhivare electronica, autentificare clienți (web site),

- Respectarea și aplicarea Regulamentului Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formule tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,

- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA

- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea cu toți utilizatorii a contractelor de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Implementarea proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.
- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;
- Grijă pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
- Grijă pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.

11. Informații referitoare la execuția contractului de mandat al Consiliului de Administrație pentru 12 luni 2023

Nr. crt.	Criteriu	U.M	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice de realizare	Pondere %	Grad de realizare
INDICATORI CHEIE FINANCIARI (20%)							
ICP privind fluxul de numerar (3,5%)							
1	Perioada de recuperare a creanțelor totale din activitatea de exploatare	zile	50	60,89	0,82	3,00	2,46
2	Perioada de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	30	8,51	3,53	0,50	0,50
ICP privind costurile (5%)							
3	Ponderele cheltuielilor cu personalul în cifra de afaceri	%	51,81	52,35	0,99	5,00	4,95
ICP privind veniturile (4%)							
4	Cifra de afaceri	lei	138.332.015	124.869.306	0,90	4,00	3,60
ICP privind profitabilitatea(7%)							
5	Rata profitului brut operational	%	4,17	4,18	1,00	5,00	5,00
6	Cheltuieli din exploatare la 1000 de lei venituri din exploatare	lei	958,31	958,24	1,00	2,00	2,00
ICP privind datoria(0,5%)							

7	Rambursarea creditului BCR (a ratelor si comisioanelor) potrivit graficului de plati	scad.	10.02.2022 10.05.2022 10.08.2022 10.11.2022	10.02.2022 10.05.2022 10.08.2022 10.11.2022	1,00	0,50	0,50
INDICATORI CHEIE NONFINANCIARI (80%)							
ICP operationali(10%)							
8	Continuitatea serviciului	ore	8	3,26	2,45	5,00	5,00
9	Durata medie de reparare a conductelor avariate de la data înregistrării reclamațiilor la Compania de Apă	zile	3	0,22	13,64	5,00	5,00
ICP orientati catre servicii publice (20%)							
10	Calitatea apei potabile	Nr. probe	16.820	17.626	1,05	7,00	7,00
11	Tratarea reclamatiiilor scrise	zile	30	19,01	1,58	8,00	8,00
12	Facturi emise pe baza contoarelor/ total facturi	%	95	99,59	1,05	5,00	5,00
ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa (50%)							
13	Implementarea sistemului de control intern managerial conform Ordin SSG nr.600/2018		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
14	Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului		trimestrial	trimestrial	1,00	15,00	15,00
15	Raport al activitatii intreprinderii		trimestrial	trimestrial	1,00	10,00	10,00
16	Raport privind evaluarea performantei Directorului General in conformitate cu prevederile Contract. de mandat		trimestrial	trimestrial	1,00	10,00	10,00
TOTAL						100,00	99,01

Pentru îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță specifici activității de guvernanta corporativă, Consiliul de Administrație al Companiei a avizat / aprobat și următoarele rapoarte: Raportul privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul Companiei de Apă Arad S.A., Raportul privind gestiunea riscurilor la nivelul Companiei de Apă Arad S.A. și Raportul de evaluare a performanței Directorului General privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care sunt similari cu cei ai Consiliului de Administrație, acestea fiind anexate prezentului raport.

Consiliul de Administrație
Președinte
Ing. Cârlogea Cristian
